

बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना : दिगो र व्यवस्थित शहरी विकास तर्फ व्यास नगरपालिकाको प्रयोग

परिचय तथा पृष्ठभूमि

सेती र मादी नदीको संगमतटमा अवस्थित महर्षि वेदव्यास र पराशरको तपोभूमिका रूपमा परिचित व्यास नगरपालिका तनहुँ जिल्लाको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको एक नगर हो । पृथ्वी राजमार्गमा काठमाडौँबाट करिब १५० कि.मी. पश्चिम तथा पोखराबाट करिब ५० कि.मी. पूर्वमा अवस्थित यस नगरपालिकाले तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौली बजारलाई केन्द्र बनाई प्रशासनिक, शैक्षिक तथा व्यापारिक गतिविधिहरूको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै आएको छ । वि.सं. २०४८ सालमा दमौली र स्याम्घा गाउँ विकास समितिका केही क्षेत्र समेटेर स्थापना भएको व्यास नगरपालिका पछिल्ला प्रशासनिक पुनर्संरचनासँगै विस्तार भई हाल १४ वडामा विभाजित नगरपालिकाका रूपमा विकसित भएको छ ।

पछिल्ला दशकहरूमा नेपालका अन्य शहरहरूजस्तै व्यास नगरपालिकामा पनि शहरीकरण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। तर योजनाबद्ध शहरी विकासको अभाव, विखण्डित जग्गा स्वामित्व, अपर्याप्त सडक सञ्जाल तथा आधारभूत पूर्वाधारको कमीका कारण धेरैजसो बस्तीहरू अव्यवस्थित रूपमा विस्तार हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्ता चुनौतीहरूले सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दिगो शहरी विकास सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी योजना तथा व्यवस्थापनका उपायहरूको आवश्यकता अझ स्पष्ट तुल्याएको छ ।

व्यास नगरपालिकामा विगतमा शहरी विकासका केही प्रारम्भिक प्रयासहरू भएका थिए । वि.सं. २०२५ सालतिर **Site and Services (साइट एण्ड सर्भिसेस)** विधि मार्फत दमौलीमा जग्गा विकास कार्यक्रम संचालन गरिएको भए पनि पर्याप्त योजना तथा सामाजिक पक्षको समुचित अध्ययन नभएका कारण उक्त प्रयास अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेन। घडेरीहरूको आकार सानो तथा साँघुरो हुनु, पर्याप्त खुला क्षेत्रको अभाव हुनु तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता नहुनु र विशेषगरी दरै तथा बोटे समुदायको विस्थापन जस्ता कारणहरूले उक्त मोडेल दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ । यस अनुभवले व्यवस्थित तथा समावेशी शहरी विकासका लागि नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेकोले पछिल्ला वर्षहरूमा व्यास नगरपालिकाले सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत पहलहरू अघि बढाएको थियो । वि.सं. २०६८ सालदेखि नगरपालिकाले राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता सँगै शहरी विकास तथा भवन तथा योजना मापदण्ड २०५८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन सुरु गर्दै सुरक्षित नगर समुदाय निर्माणका लागि आवश्यक कदम चाल्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा भवन निर्माण संहिताको सफल कार्यान्वयन पश्चात “दरो घर, दिगो बस्ती” को अवधारणा अनुरूप योजनाबद्ध शहरी विकासका लागि प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम (जग्गा एकीकरण/Land Pooling) विधिलाई अपनाउने पहल गरिएको हो । प्रारम्भिक रूपमा २०७६ सालमा व्यास नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित रानीगाउँ क्षेत्रमा करिब ११०० रोपनी क्षेत्रफलमा जग्गा एकीकरण विधि मार्फत एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने भनि परामर्शदाता मार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । तर स्थानीय उपभोक्ता देखि जनप्रतिनिधि लगायत प्रशासनिक तहमा उक्त कार्यक्रम सम्बन्धि बुझाइको अभाव तथा परामर्शदाताबाट अपेक्षित स्तरको सहजीकरण हुन नसक्दा स्थानीय स्तरबाट चर्को विरोध भएकोले उक्त आयोजना अघि बढ्न सकेन ।

यसरी व्यास नगरपालिकाले रानीगाउँ जग्गा एकीकरण आयोजना भोगेको असफलताबाट भएको सिकाईलाई आत्मसाथ गरी नयाँ विकल्पका रूपमा वडा नं. १० स्थित बैरेनी क्षेत्र, वडा नं. ०५ स्थित मानहुँकोट र वडा नं.

०६ स्थित शिसाघाट क्षेत्र लाई एकीकृत जग्गा विकास आयोजनाका लागि उपयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको थियो । जस मध्ये दमौली बजारबाट निकट रहेको बैरेनी क्षेत्रमा व्यास नगरपालिकाद्वारा जग्गा एकीकरण विधि मार्फत एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुरूप २०७७ सालमा व्यास नगरपालिका द्वारा नगर विकास समिति अन्तर्गत आयोजना व्यवस्थापन उप-समिति गठन गरी उक्त उप-समितिद्वारा जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना भई बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन, मस्यौदा योजना तयारी हुँदै शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृति पश्चात कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको करिब ३ वर्ष पछि यो आयोजना कार्यान्वयनको हाल अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

यसरी विगतका प्रयासहरूबाट प्राप्त सिकाइलाई आत्मसात गर्दै व्यास नगरपालिकाले बैरेनी क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजना नगर गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको हो । यस पहलले केवल भौतिक पूर्वाधार विकास मात्र नभई व्यवस्थित, समावेशी र दिगो बस्ती निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ। साथै, स्थानीय सहभागिता, संस्थागत क्षमता र नवीन कार्यान्वयन दृष्टिकोणको समन्वयमार्फत यो आयोजना व्यास नगरपालिकाको योजनाबद्ध शहरी विकास यात्रामा एक महत्वपूर्ण मोडका रूपमा स्थापित भएको छ ।

जग्गा एकीकरण आयोजनाको अवाधारणा, परिभाषा तथा कार्यविधि/प्रक्रिया

अवधारणा : नेपालमा तीव्र शहरीकरणका कारण अव्यवस्थित बस्ती विकास, अपर्याप्त सडक, ढल, खुला क्षेत्र तथा अन्य पूर्वाधारको अभाव जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। परम्परागत रूपमा जग्गा अधिग्रहण गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्दा असमान लाभ वितरण र कतिपय अवस्थामा विस्थापनसमेत हुने गरेको छ । यस सन्दर्भमा, जग्गा एकीकरण (Land Pooling) एक प्रभावकारी र समावेशी विधिको रूपमा प्रयोगमा आएको छ ।

परिभाषा : “विभिन्न व्यक्ति एवं संघसंस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गालाई जग्गाधनीहरूको सक्रिय सहभागिता तथा प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा जग्गा योगदान दिने गरी एउटै कित्ता बनाई त्यसमा बाटोघाटो, ढल, खुला तथा अन्य सामुदायिक स्थलहरू जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गरी चारकिल्ला मिलेका विकसित कित्ताहरूमा पुनःविभाजन गरी साविकका जग्गाधनीहरूलाई नै फिर्ता दिने प्रक्रियालाई जग्गा एकीकरण भनिन्छ ।”

यसलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) को उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, जहाँ :

- जग्गाधनीहरूले आ-आफ्नो जग्गाबाट केही हिस्सा योगदान गर्छन्
- पूर्वाधार विकास त्यही योगदानबाट सम्भव हुन्छ
- सबैलाई समानुपातिक लाभ प्राप्त हुन्छ


जग्गा एकीकरणको आवश्यकता र महत्व निम्न लिखित बुंदामा समावेश गरिएको छ :


- अव्यवस्थित शहरी विस्तार नियन्त्रण गर्न
- पूर्वाधार (सडक, ढल, पार्क) विकास गर्न
- कृषियोग्य जग्गाको अनियन्त्रित प्लटिङ रोक्न
- व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्न
- जग्गाको उपयोगिता र मूल्य वृद्धि गर्न


चरणगत कार्यान्वयन प्रक्रिया / कार्यविधि :

जग्गा एकीकरण आयोजना चरणबद्ध रूपमा निम्न प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गरिन्छ :

जग्गा एकीकरण योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया

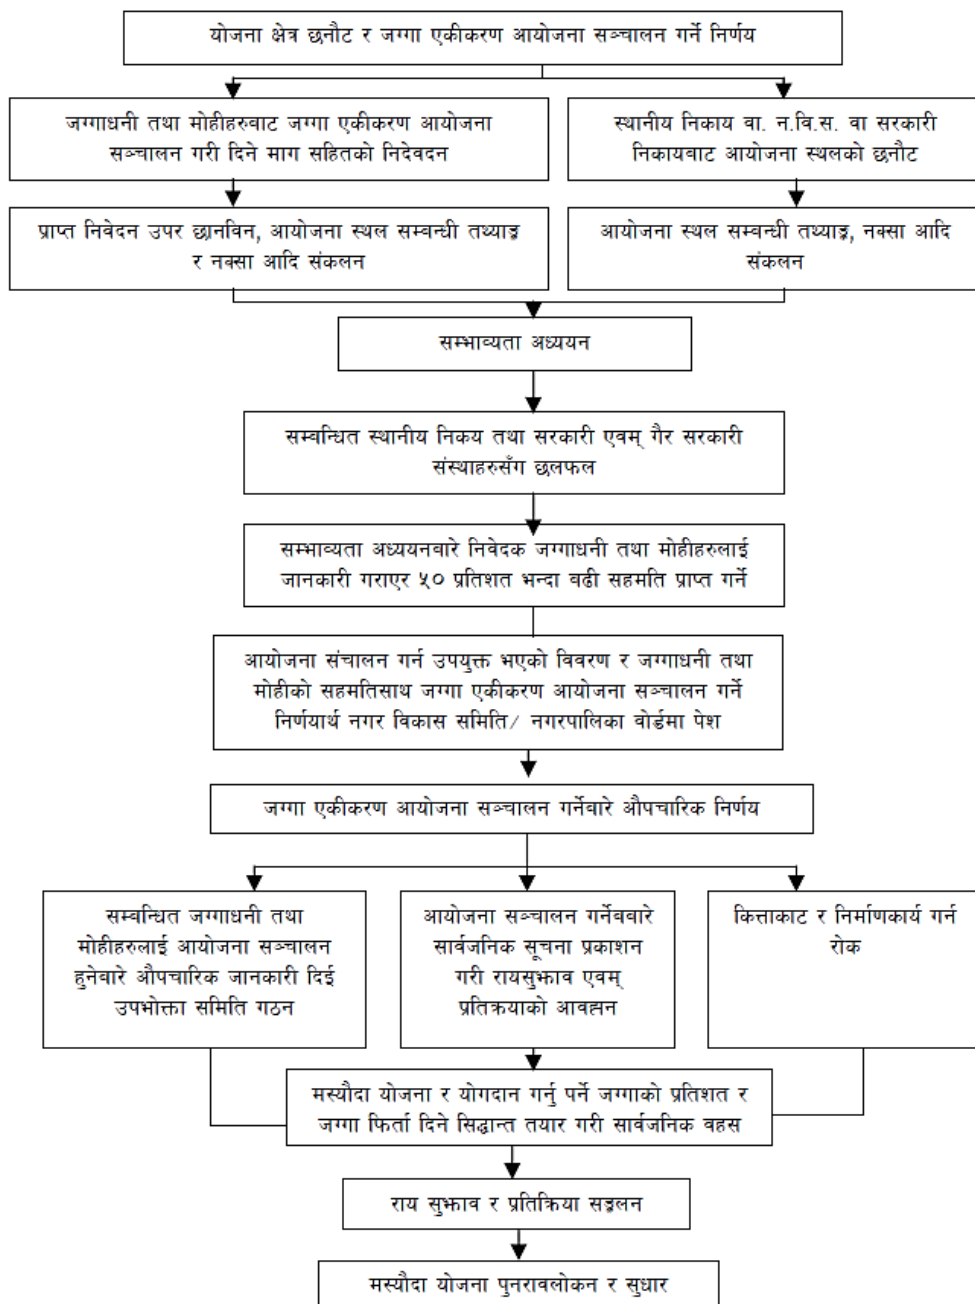

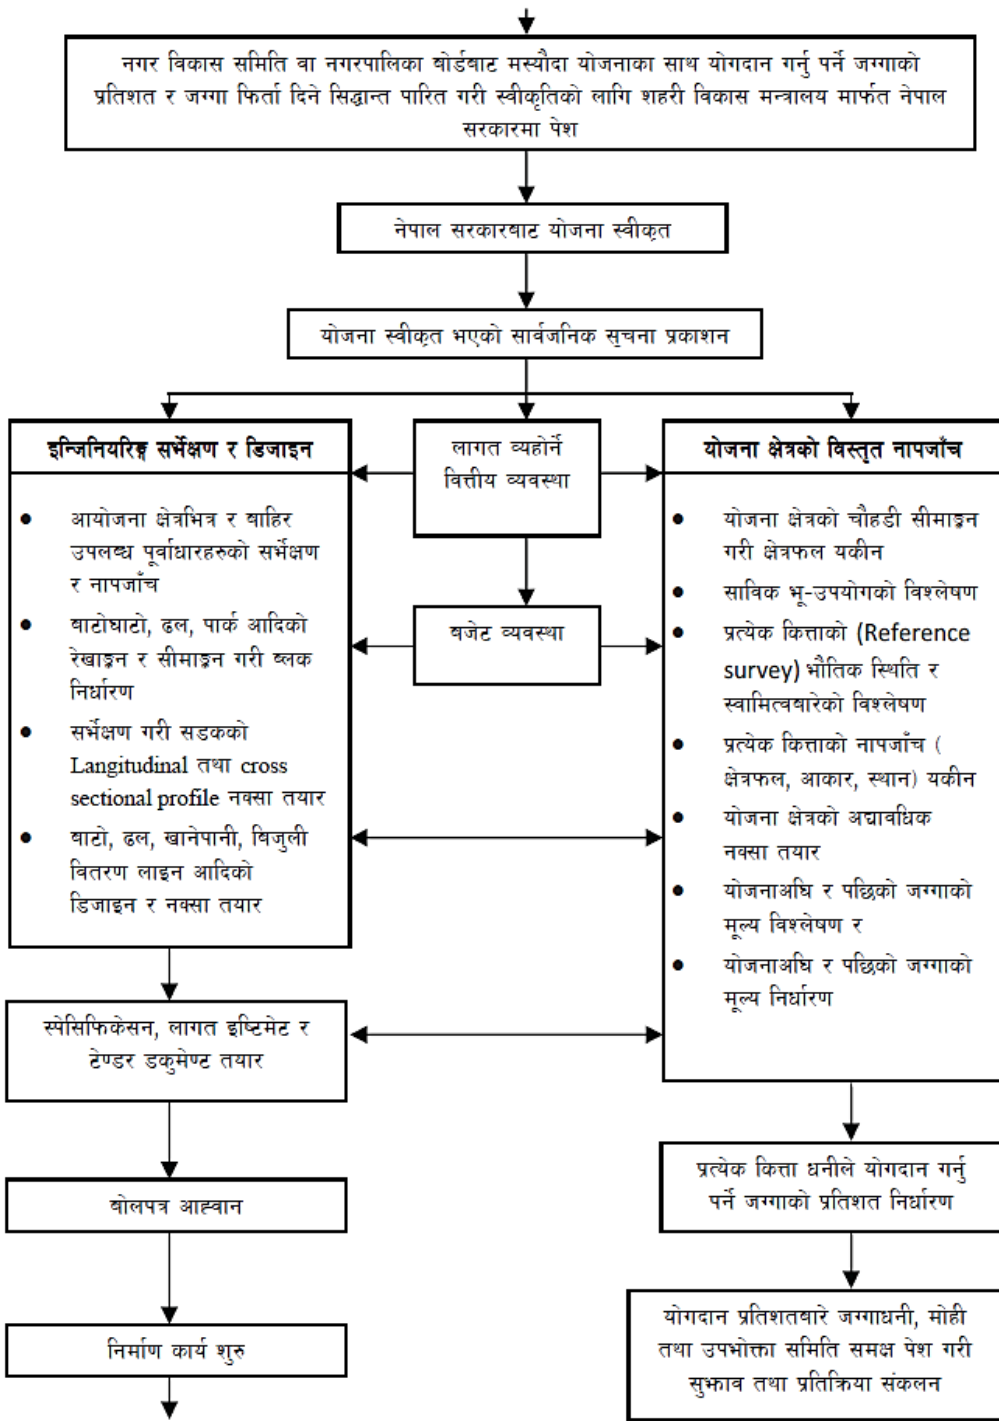

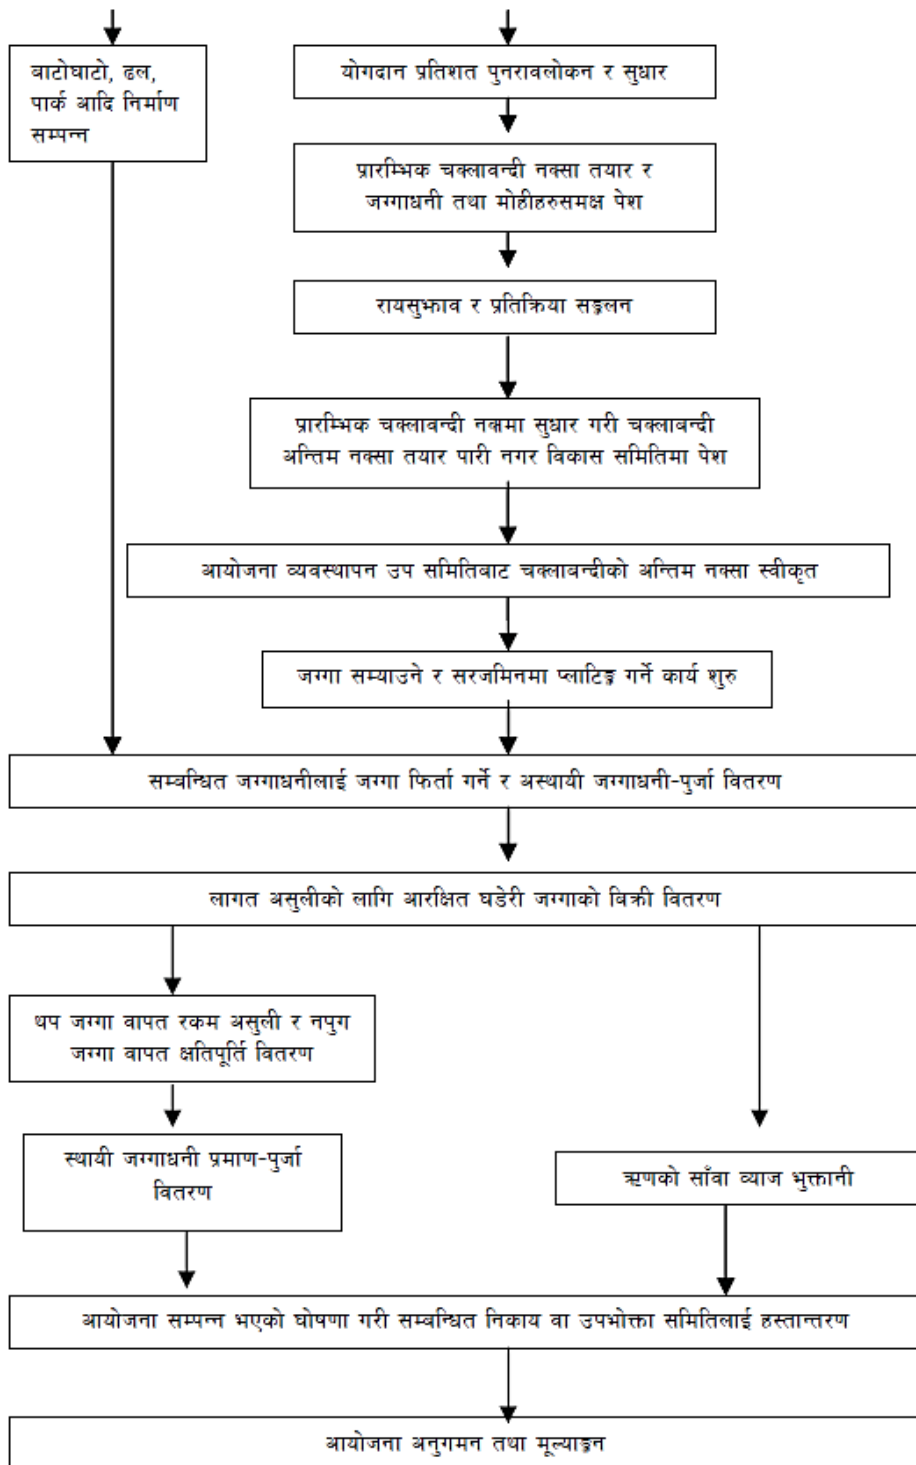

बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजनाको परिचय

व्यास नगरपालिका, वडा नं. १० को बैरेनी क्षेत्र, दमौली बजारबाट उत्तर तर्फ भोर्लेटार चोकबाट करिब ४ कि.मी. टाढा व्यास मार्गमा अवस्थित छ। बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना दिगो तथा व्यवस्थित शहरी विकासका लागि व्यास नगरपालिकाद्वारा २०७७ साल माघमा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज, नेपाल (NSET) को प्राविधिक सहयोगमा संचालन गर्ने निर्णय गरि काठमाडौं उपत्यका बाहिर तथा गण्डकी प्रदेशमा नै पहिलो पटक स्थानीय निकायले प्रारम्भ गरिएको आयोजना हो। उक्त निर्णय बमोजिम व्यास नगरपालिका तथा NSET को केहि कर्मचारीहरू समावेश गरि जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन इकाई को गठन भएको थियो। उक्त आयोजना कार्यान्वयन इकाईले करिब १५०० रोपनी क्षेत्रफलमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। यसै सिलसिलामा आयोजना संचालन गर्न सम्भव देखिए पश्चात प्रथम चरणमा करिब २६१ रोपनी क्षेत्रफलमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोजनाको मस्यौदा योजना तयार गरी शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएकोमा नेपाल सरकारबाट स्विकृत भई २०७८/११/०२ गते को राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। व्यास नगरपालिका तथा उपभोक्ताको लगानी तथा नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा संचालन भैरहेको बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना हाल कार्यान्वयन चरणमा सडक, ढल, खानेपानी तथा बिजुली पोल निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा छ। यसैगरी प्रत्येक जग्गाधनीहरूले गर्नु पर्ने योगदानको स्वीकृत विस्तृत योगदान तालिका (Long Sheet) तथा चक्काबन्दी नक्शा बमोजिमको नापी नक्सा र सेस्ता विवरण तयार भई फिर्ता गर्ने प्रक्रियाका लागि नापी तथा मालपोत कार्यालयमा पठाई सकिएको छ। आगामी दिनमा जग्गाको चार किल्ला सिमांकन गरि आयोजनाका सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा सहित जग्गा फिर्ता गरिने छ। त्यस पश्चात पूर्वाधार निर्माणका लागि आरक्षित घडेरी बिक्रि गरि विभिन्न चरणमा नगर विकास कोष लाई ऋण रकम भुक्तानी गराइने छ।



चित्र १ निर्माणाधीन प्रथम चरणको आयोजना क्षेत्रको सेटेलाइट तस्विर (२०८२, फल्गुन)



चित्र २ आयोजनाको स्वीकृत चक्काबन्दी नक्सा

आयोजनाको संक्षिप्त विवरण

आयोजनाको नाम	वैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना (प्रथम चरण)
आयोजना स्थल	वैरेनी, वडा नं. १०, व्यास नगरपालिका, तनहुँ
आयोजना क्षेत्रफल	१,३३,५८२.२९ वर्ग मि. (२६२-९-०-४ रोपनी)
आयोजना को चार किल्ला	पूर्व : व्यास मार्ग देखि करिब ५० मि. भित्र पश्चिम : मादी नदिले कटान गरी बनेको माथिल्लो डील उत्तर : बोटेनी खोल्सी दक्षिण : बोटे गाउँ जाने ९ मि. पक्क सडक
कुल साविक कित्ता संख्या	३४७
लाभग्राही संख्या	२३१
आयोजना स्वीकृति	२०७८ फाल्गुन २ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित
कार्यान्वयन निकाय	व्यास नगरपालिका, जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन इकाई
लगानी स्रोत (बिँज पूँजी)	व्यास नगरपालिका लगानी (३०%), नगर विकास कोष ऋण (७०%)
सहयोगी संस्था	● भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज, नेपाल (NSET) - विज्ञ प्राविधिक सहयोग

	● नगर विकास कोष - ऋण सहयोग ● देको-मिवा-ईतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना, भक्तपुर - अनुभव साभा तथा प्राविधिक मार्गदर्शन
मुख्य पूर्वाधार	सडक, ढल, खानेपानी तथा अन्य शहरी सेवा संरचना
कुल आयोजना लागत (रु.)	९,२४,७०,०१८.७७ /- (मु. अ. कर समेत)

आयोजनाको प्रस्तावित भू- उपयोग

क्र.स	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (व. मि)	रो - आ -पै - दा	प्रतिशत(%)	कैफियत
१.	विकसित निजि घडेरी	९०६४७.४९	१७८-२-३-३	६७.८६%	
२.	बाटो र ढल	२५८३३.१३	५०-१२-१-४	१९.३४%	
३.	खुल्ला क्षेत्र (सार्वजनिक)	१०७५४.२८	२१-२-०-४	८.०५%	
४.	विक्रियोग्य जग्गा (क्वभिक एयित)	६२१४.८९	१२-३-१-४	४.६५%	पूर्वाधार निर्माण
५.	खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागका लागि छुटाईएको जग्गा	१३२.४२	०-४-०-३	०.१०%	
	जम्मा	१३३५८२.२१	२६२-९-०-४	१००.००%	


आयोजनाका मुख्य पूर्वाधार/भौतिक संरचना :

क्र.स.	पूर्वाधार	विवरण	
१.	सडक/ढल	कालो पत्रे सडक (पक्कि, नाला कभर सहित/टिक ड्रेन)	८ मि. चौडाई भएको सडक - ४२२ मि. ७ मि. चौडाई भएको सडक - १२१५ मि. ६ मि. चौडाई भएको सडक - २२२० मि. ४ मि. चौडाई भएको सडक - ३३४ मि.
२.	ढल व्यवस्थापन	आयोजना क्षेत्रको ढललाई सुरक्षित तवरले व्यवस्थापन गर्न आयोजना को बीच को धाप क्षेत्रमा ठुलो ढल निकास नालीको निर्माण गरिने	
३.	विद्युत प्रसारण लाइन तथा पोल	आयोजना क्षेत्रमा विद्युत पोल (PSC Pole) को निर्माण गरिने तथा प्रसारण लाइनका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र विद्युत प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्रसंग समन्वयद्वारा सहयोग हुने	
४.	खानेपानी संजाल	HDPE /Closed Loop	सडक दायाँ बायाँ सडक संजालसँगै आवश्यक पाइप बिछ्याईने । HDPE 76 mm - ६१० मि. HDPE 63 mm - ६८१८ मि.
५.	आयोजना कार्यान्वयन इकाईको भवन	Low cost Pre-Fabricated Building	आयोजना क्षेत्र भित्र १२७० व.फिट. क्षेत्रफलको प्रि-फ्याब भवन निर्माण गरिने

आयोजनाका महत्वपूर्ण मितिहरू:

मिति	महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू
२०७७ मङ्सिर ३०	व्यास नगरपालिकाद्वारा आयोजना संचालन गर्न सूचना प्रकाशन
२०७८ फाल्गुन ०२	आयोजनाको मस्यौदा योजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित
२०७९ मङ्सिर १४	नगर विकास कोषसंग ऋण सम्झौता
२०७९ फाल्गुन १२	पहिलो चरणको निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान (सूचना जारी)
२०८० चैत्र २०	पहिलो चरणको निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी श्री Bishwas and Bipu Construction, Jorpati, Kathmandu संग सम्झौता
२०८० श्रावन ३२	जग्गा योगदान तथा फिर्ता दिने नीति र जग्गा योगदान प्रतिशतको तालिका पारित
२०८० भदौ १३	लंग शीट तथा चक्काबन्दी नक्सा सार्वजनिक गरि सूचना जारी
२०८० पौष १३	दोस्रो चरण को निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान (सूचना जारी)
२०८० चैत्र २५	दोस्रो चरणको निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी श्री HRB-Shivadev JV, Dhulikhel-4, Kavre संग सम्झौता
२०८१ माघ १४	जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनकालागि बढीमा १ वर्षको लागि हक हस्तान्तरण समेत नहुने गरी आयोजनाको सम्पूर्ण जग्गाको कित्ताकाट, खरिद विक्री तथा भौतिक निर्माण पुनः रोक्का गरिएको
२०८१ पौष २९	ब्लक ले-आउट नक्सा, चक्काबन्दी नक्सा र विस्तृत योगदान तालिका (Long Sheet) को अन्तिम स्वीकृति

आयोजनाको संगठनात्मक संरचना

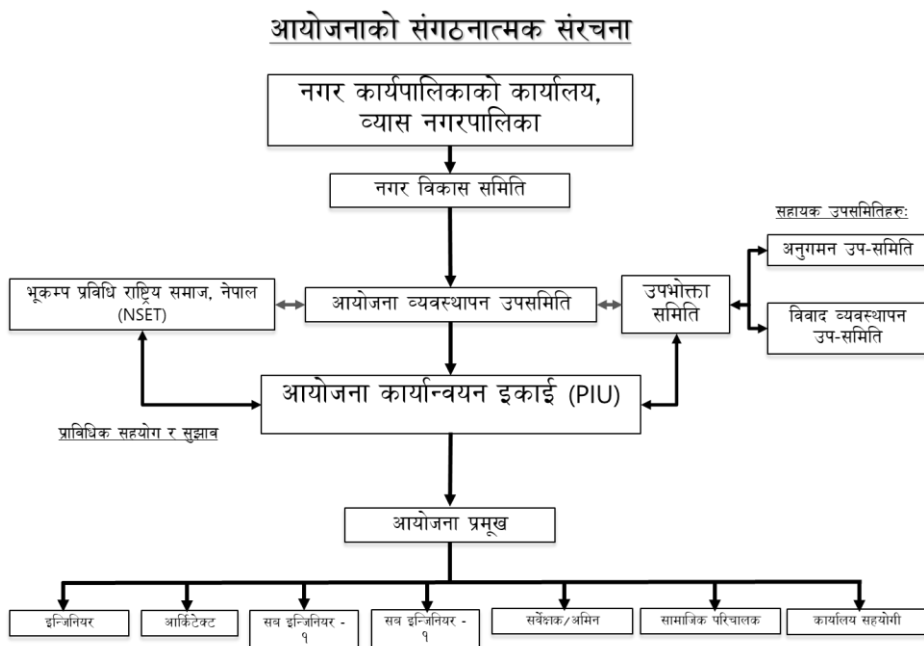

चित्र ३ : आयोजनाको संगठनात्मक संरचना

बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभिन्न तहको संगठनात्मक संरचनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । केवल नीतिगत निर्णय मात्र होइन, कार्यान्वयनलाई चुस्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न समिति तथा उप-समितिहरू र इकाई को गठन गरिएको छ, जसले जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गरेको छ ।

१) नगर विकास समिति (माथिल्लो तह) (Town Development Committee)

- नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम गठन भएको ।
- यो अन्तिम निर्णय गर्ने समिति हो ।
- आयोजना स्वीकृति, चारकिल्ला निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन तथा प्रमुख नीतिगत निर्णयहरू लिन्छ ।
- सम्पूर्ण आयोजनालाई वैधानिक र संस्थागत आधार प्रदान गर्छ ।

व्यास नगर विकास समिति

क्र.स.	तह	पद	कार्यालय
१.	संयोजक	नगर प्रमुख	व्यास नगरपालिका
२.	सदस्य	नगर उप-प्रमुख	व्यास नगरपालिका
३.	सदस्य	कार्यालय प्रमुख	जिल्ला समन्वय समिति
४.	सदस्य	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ
५.	सदस्य	प्रमुख मालपोत अधिकृत	मालपोत कार्यालय तनहुँ
६.	सदस्य	प्रमुख नापी अधिकृत	नापी कार्यालय, तनहुँ
७.	सदस्य	वडाध्यक्ष	वडा नं. १० कार्यालय
८.	सदस्य	वडाध्यक्ष	वडा नं. ०६ कार्यालय
९.	सदस्य	वडाध्यक्ष	वडा नं. ०५ कार्यालय
१०.	सदस्य		
११.	सदस्य		
१२.	सदस्य सचिव	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	व्यास नगरपालिका

२) आयोजना व्यवस्थापन उप-समिति (Project Management Sub-Committee)

- यो नगर विकास समिति अन्तर्गत गठित उप-समिति हो ।
- आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन, समन्वय र निर्देशन आयोजना व्यवस्थापन उप-समिति गर्ने निकाय।
- आयोजना कार्यान्वयन इकाईबाट भएका कार्यहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा आवश्यक निर्णयहरू गर्छ।
- विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय गरी आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी हुन्छ।

आयोजना व्यवस्थापन उप-समिति

क्र.स.	तह	पद	कार्यालय
१	संयोजक	नगर प्रमुख	नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, व्यास नगरपालिका
२	सदस्य	नगर उप-प्रमुख	नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, व्यास नगरपालिका
३	सदस्य	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ
४	सदस्य	प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत	व्यास नगरपालिका
५	सदस्य	वडा अध्यक्ष	वडा-१० कार्यालय, व्यास नगरपालिका
६	सदस्य	कार्यालय प्रमुख	जिल्ला मालपोत कार्यालय, तनहुँ
७	सदस्य	कार्यालय प्रमुख	जिल्ला नापी कार्यालय, तनहुँ
८	सदस्य	आयोजना प्रमुख	संघिय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, पोखरा, कास्की
९	सदस्य	सिनियर डिभिजन इन्जिनियर	सडक डिभिजन कार्यालय, तनहुँ
१०	सदस्य	सिनियर डिभिजन इन्जिनियर	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, तनहुँ
११	सदस्य	कार्यालय प्रमुख	नेपाल विद्युत प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्र, तनहुँ
१२	सदस्य	वरिष्ठ शहरी योजनाकार	भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल, सैबु भैसेपाटी, ललितपुर
१३	सदस्य	जग्गा धनि प्रतिनिधि १	बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना
१४	सदस्य	जग्गा धनि प्रतिनिधि २	बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना
१५	सदस्य	न्यायिक सहजकर्ता	नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, व्यास नगरपालिका
१६	सदस्य सचिव	आयोजना प्रमुख	बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना

३) उपभोक्ता समिति (Users Committee)

- यो स्थानीय जग्गाधनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य समिति हो।
- आयोजना सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा प्रथम थहमा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्छ।
- स्थानीय आवश्यकता, सुझाव तथा गुनासोहरू आयोजना कार्यान्वयन इकाई र माथिल्लो निकायसम्म पुर्‍याउने काम गर्छ।
- आयोजनाप्रति अपनत्व र पारदर्शिता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
- यस समितिमा सर्वदलीय समावेशीता रहेको र समुदायको विकासका लागि सबै दलहरूको एकै प्रतिवद्धता रहेकोले आयोजना सम्बन्धि निर्णयहरू लिन सहज भएको छ।

उपभोक्ता समिति

क्र.स.	तह/पद	नाम
१.	संयोजक/अध्यक्ष	श्रीराम कुँवर
२.	उपाध्यक्ष	मायानाथ कोइराला
३.	सचिव	खम बहादुर दरै
४.	कोषाध्यक्ष	गायत्री पुडासैनी
५.	सदस्य	भूमिलाल ठकाल
६.	सदस्य	फुन नारायण तिवारी
७.	सदस्य	धन बहादुर दरै
८.	सदस्य	होम बहादुर बोटे
९.	सदस्य	सिता बोटे
१०.	सदस्य	लक्ष्मी परियार
११.	सदस्य	देवका देवी पौडेल
१२.	सदस्य	बाबुराम पौडेल

४) आयोजना कार्यान्वयन इकाई (तल्लो तह) (एचयवभअत कउभिभलतबतष्यल गलप्त (PIU))

- यो ईकाई आयोजना व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत गठित आयोजनाको मुख्य कार्यान्वयन इकाई हो।
- आयोजना प्रमुखको नेतृत्वमा इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, सर्वेयर(अमिन), सामाजिक परिचालक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरू संलग्न हुन्छन्।
- आयोजनाको कार्यतालिका बमोजिम अध्ययन गर्ने, ब्लक ले-आउट नक्सा डिजाइन, विस्तृत योगदान तालिका (लांग शीट), चक्लाबन्दी नक्सा तयार गर्ने, इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने, पूर्वाधार निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने, उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने लगायतको दैनिक समन्वय तथा प्राविधिक कार्यहरू सञ्चालन गर्छ।
- आयोजनाको कार्यतालिका अनुसार कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यसै इकाईमा रहन्छ।

आयोजना कार्यान्वयन इकाई

क्र.स.	पद	कर्मचारीको नाम
१.	आयोजना प्रमुख	ई. रविन्द्र लाल मूल
२.	इन्जिनियर	ई. कपिल रिजाल
३.	आर्किटेक्ट	आ. मन्दिर श्रेष्ठ
४.	सब-इन्जिनियर-१	ब.स.ई. विकास रिमाल
५.	सब-इन्जिनियर-२	-
६.	सर्वेक्षक / अमिन	अमिन रोहित दरै
७.	सामाजिक परिचालक	-
८.	कार्यालय सहयोगी	सुर्य कुमारी दरै

५) अन्य सहायक उप-समितिहरू(उपभोक्ता समिति अन्तर्गत गठित)

१. अनुगमन उप-समिति

- आयोजनाका कार्यहरू समय, लागत र गुणस्तर अनुसार भइरहेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन गर्ने।
- पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने।

अनुगमन उप-समिति

क्र.स.	तह	नाम
१.	संयोजक/अध्यक्ष	ऋषिराम हुंगाना
२.	सदस्य	यज्ञप्रसाद गौतम
३.	सदस्य	सागर घिमिरे
४.	सदस्य	अञ्जलि दरै
५.	सदस्य	मनमाया बोटे

२. विवाद व्यवस्थापन उप-समिति

- जग्गाधनीबीच उत्पन्न हुने विवाद तथा असहमति समाधान गर्ने।
- आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध आउन नदिने गरी सहजीकरण गर्ने।

विवाद व्यवस्थापन उप-समिति

क्र.स.	तह	नाम
१.	संयोजक	मायानाथ कोइराला
२.	सदस्य	दुर्गा पौडेल
३.	सदस्य	नारायण अधिकारी
३.	सदस्य	खुम बहादुर दरै

जग्गा एकीकरण सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था

नेपालमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न विभिन्न कानून, ऐन तथा नियमावलीहरूले कानुनी आधार प्रदान गरेका छन्। यी कानुनी प्रावधानहरूले आयोजना स्वीकृति, जग्गा व्यवस्थापन, पुनःविन्यास, तथा पूर्वाधार विकासका प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छन्।

मुख्य रूपमा सम्बन्धित कानूनहरू निम्न तालिका अनुसार छन् :

क्षेत्र	ऐन / नियम / कार्यविधिको नाम	मुख्य उद्देश्य तथा प्रयोजन
सहरी विकास तथा योजना, मापदण्ड	नगर विकास ऐन, २०४५	जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन गर्ने, चारकिल्ला तोक्ने र आयोजना क्षेत्रको जग्गा रोक्का गर्ने मुख्य कानुनी आधार प्रदान गर्ने ।
	नगर विकास निर्देशिका, २०६१	जग्गाधनीको मन्जुरी लिने, विकसित घडेरी फिर्ता गर्ने र आयोजना सञ्चालनको विस्तृत कार्यविधि।
	काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०३९	(उपत्यका भित्रका आयोजनाका लागि) जग्गा विकास र भौतिक योजना स्वीकृत गर्ने अधिकार।
	शहरी विकास तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२	जग्गा एकीकरण आयोजनामा भवन तथा पूर्वाधार विकासका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने।
स्थानीय शासन	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४	नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र जग्गा विकास (बिलम म्भखभयिऊभलत) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार।
	स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५	स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा जग्गा विकास तथा शहरी योजना कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने।
भूमि प्रशासन (मालपोत र नापी)	मालपोत ऐन, २०३४ तथा	आयोजना क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व सेस्ता कायम गर्ने, दाखिल खारेज र सेस्ता अद्यावधिक गर्ने।
	मालपोत नियमावली, २०३६	आयोजनाको सिमाना छुट्याउने, कित्ताकाट गर्ने र नयाँ नक्सा (द्यियअप एबिल) अनुसार नक्सा पास गर्ने।
	आयोजना क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व सेस्ता कायम गर्ने, दाखिल खारेज र सेस्ता अद्यावधिक गर्ने।	जग्गाको वर्गीकरण (आवासीय, कृषि, व्यावसायिक आदि) र सोही अनुसारको उपयोग सुनिश्चित गर्ने।
	जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ तथा नियमावली, २०५८	जग्गा एकीकरण आयोजनामा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरूलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गर्ने।
	भू-उपयोग ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७९	जग्गाको स्वामित्व, हदबन्दी तथा उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था मिलाई जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयनलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने।

	भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१	जग्गाको हदबन्दी र मोहियानी हक सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने।
	भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१	सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न कानुनी आधार प्रदान गर्ने।
	भूमिसुधार ऐन, २०२१	आयोजना क्षेत्रभित्र गुठी जग्गा परेमा त्यसको व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति वा सट्टापट्टा सम्बन्धी व्यवस्था।
	जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४	आयोजना भित्रका गुठी जग्गामा बाटो खोल्न पर्ने भएमा सो जग्गा एकीकरणका लागि गुठी संस्थानको सहमति सम्बन्धि व्यवस्था
गुठी तथा विशेष जग्गा	गुठी संस्थान ऐन, २०३३	आयोजनाको वातावरणीय पक्षको अध्ययन गरी आयोजना को वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आधार प्रदान गर्ने
	गुठी जग्गामा बाटो कायम गर्ने कार्यविधि, २०७३	सडक, नाला, बिजुली जस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया र सम्भौता व्यवस्थापन गर्ने। पूर्वाधार निर्माणको ठेका प्रक्रिया, ठेक्का हस्तान्तरण, संचालन र मुल्यांकन व्यवस्थापन गर्ने ।
वातावरण संरक्षण	वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७	जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन गर्न अवधारणा देखि अन्तिम कार्यान्वयन सम्म सहयोगी सन्दर्भ सामग्री प्रदान गर्ने
सार्वजनिक खरिद (निर्माण)	सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४	सडक, नाला, बिजुली जस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया र सम्भौता व्यवस्थापन गर्ने। पूर्वाधार निर्माणको ठेका प्रक्रिया, ठेक्का हस्तान्तरण, संचालन र मुल्यांकन व्यवस्थापन गर्ने ।
जग्गा एकीकरण सन्दर्भ सामग्री	जग्गा एकीकरण आयोजना संचलान कार्यविधि सन्दर्भ पुस्तिका, २०७२	जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन गर्न अवधारणा देखि अन्तिम कार्यान्वयन सम्म सहयोगी सन्दर्भ सामग्री प्रदान गर्ने

व्यास नगरपालिकाले अपनाएको कार्यान्वयन रणनीति

वैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा व्यास नगरपालिकाले केही महत्वपूर्ण रणनीतिक व्यवस्थापन तथा कार्यप्रणाली अपनाएको छ, जसले आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गरेको छ।

मुख्य रणनीतिहरू:

- **स्थानीय सरकारको एकल नेतृत्वमा आयोजना सञ्चालन:**

यस आयोजना पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सञ्चालन भएको पहिलो उदाहरण हो। आयोजनामा स्थानीय सरकारको नेतृत्वले नगरबासीमा विश्वास कायम रहेको जसले गर्दा आयोजना प्रति नगरवासी सकारात्मक रहेका छन्।

व्यास नगरपालिकाले आफ्नै आयोजना कार्यान्वयन इकाई गठन गरी आयोजनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया आफैँ सञ्चालन गरिरहेको छ।

- **समुदायको सक्रिय सहभागिता**

आयोजना सञ्चालनका क्रममा जग्गाधनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न बैठक, परामर्श तथा सहमति प्रक्रियाहरू सञ्चालन गरिएको छ। चरणबद्ध अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणले आयोजना प्रति सरोकारवालाहरूमा स्पष्ट बुझाई तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि, जग्गाधनी, आयोजना कार्यान्वयन इकाई तथा नगरपालिका कर्मचारीहरूलाई समावेश गरी विभिन्न चरणमा काठमाडौँस्थित सफल जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूको अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण सञ्चालन गरिएको थियो। यसबाट सहभागीहरूले योजनाबद्ध शहरी विकासको प्रत्यक्ष अनुभव हासिल गर्न पाएका कारण आयोजना प्रति सकारात्मक धारणा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ।

- **सङ्गठनात्मक संरचना**

आयोजना संचालन गर्न नगर कार्यपालिका, नगर विकास समिति अन्तर्गत आयोजना व्यवस्थापन उप-समिति, जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन इकाई लगायत उपभोक्ता तथा स्थानीय जग्गाधनी लाई समावेश गरी उपभोक्ता समिति, विवाद व्यवस्थापन उप-समिति, अनुगमन उप-समिति जस्ता विभिन्न तह को स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको संरचनात्मक संगठनले आयोजना कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउँदै समग्र प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाएको छ।

- **चरणबद्ध कार्यान्वयन**

ठूलो क्षेत्रलाई एकैपटक विकास गर्नुको सट्टा पहिलो चरणमा पाईलट आयोजनाका रूपमा २६१ रोपनी क्षेत्रफलमा आयोजना कार्यान्वयन गरिएको हो जसले गर्दा जग्गाधनी समुदायलाई सम्बोधन गर्न सहज भएको र समग्र व्यवस्थापन गर्न सहज भएको।

- **वित्तीय व्यवस्थापन**

आयोजनाको वित्तीय स्रोत निम्नानुसार रहेको छ:

❖ व्यास नगरपालिका: ३०% (बिँज पूँजी)

❖ नगर विकास कोष ऋण: ७०% (बिँज पूँजी)

यस मोडेलले Self-Financing Development Model को उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। जग्गाधनीको योगदान बापत प्राप्त भएको जग्गा बेचेर नगर विकास कोषको ऋण रकम चुक्ता गरिन्छ। यसमा व्यास नगरपालिकाको ३०% लगानीले जग्गाधनिको योगदान प्रतिशत लाई जग्गाधनीद्वारा स्वीकार्य हुने अंकमा ल्याईएको छ।

बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजनाका सबल पक्ष तथा चुनौतीहरु

आयोजनाका सबल पक्षहरु :

- **स्थानीय सरकार नेतृत्वको र अपनत्व :**
यो काठमाडौँ उपत्यका बाहिर स्थानीय सरकार (व्यास नगरपालिका) आफैँले पूर्ण स्वामित्व लिएर सुरु गरेको पहिलो नमुना आयोजना हो ।
- **सर्वपक्षीय सहमति र समावेशिता :**
आयोजनामा सबै राजनीतिक दलहरूको साभा प्रतिबद्धता छ । उपभोक्ता समितिमा आदिवासी दराई, बोटे समुदाय र महिलाहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वले यसलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार्य बनाएको छ ।
- **स्थिर र समर्पित प्राविधिक टोली :**
आयोजना कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले एक स्थायी “जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU)” परिचालन गरेको छ । यस टोलीमा स्थानीय कर्मचारीहरू समेत सुरुदेखि नै स्थिर रूपमा खटिएकाले जनतासँग बलियो विश्वासको सम्बन्ध स्थापित भएको छ ।
- **स्वायत्त उपभोक्ता समिति :**
वडा अध्यक्षलाई समितिमा नराखी स्थानीय बासिन्दालाई नै नेतृत्व सुम्पेँदा आयोजनामा पारदर्शिता र अपनत्व बढेको छ ।
- **प्रयोगात्मक सिकाई :**
जग्गाधनीहरूलाई काठमाडौँ र भक्तपुरका सफल आयोजनाहरूको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गराउनाले विकासको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न र भ्रमहरू चिर्न मद्दत पुगेको छ ।
- **सामाजिक संवेदनशीलता र लचकता :**
आयोजना अवधिभर जग्गा रोक्का भए तापनि विशेष परिस्थिती तथा संकटको समयमा जग्गा बिक्री गर्न दिने लचिलो नीतिले उपभोक्ता जग्गाधनिलाई राहत दिएको र आयोजना प्रति सकारात्मक बनाएको छ ।

आयोजनाका चुनौतीहरु :

यस आयोजनाले ठुलो आशा जगाए पनि कार्यान्वयनका क्रममा निम्नानुसारका केही समस्या र चुनौतीहरूदेखिएका छन् ।

- **निर्माण कार्यमा ढिलाइ :**
प्रारम्भ भएको १.५ वर्ष मा नैनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि १.५ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। ठेकेदारहरूको ढिलासुस्ती र कार्यस्थलमा न्यून उपस्थितिका कारण काम सुस्त भएको छ। यसले विशेष गरी किसानहरूलाई असर पारेको छ, किनकि उनीहरूले न खेती गर्न पाएका छन्, न जग्गा बेच्न नै ।
- **मालपोत र नापी कार्यालयसँग समन्वयमा समस्या :**
मालपोत र नापी कार्यालयसँगको समन्वय ढिलो र जटिल भएको छ। जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र मालपोत कार्यालयको आधिकारिक अभिलेख (सेस्ता विवरण) को कागजी र डिजिटल रेकर्डमा जग्गाको विवरण र क्षेत्रफलमा असंगति देखिएकाले सुधार गर्न समय लागेको छ। प्रमुख अधिकारीहरूको बारम्बार सरुवाले समन्वयमानिकैसमस्या आएको छ ।

- **गुठी जग्गाको कानुनी अन्योल :**

आयोजना क्षेत्रभित्रका गुठी जग्गाको व्यवस्थापनमा कानुनी जटिलता छ। क्षतिपूर्ति र मुआब्जा सम्बन्धी प्रावधानहरू जग्गा एकीकरणको अवधारणासँग मेल नखाँदा जग्गाधनीहरूलाई विकसित घडेरी फिर्ता गर्न कठिन भइरहेको छ ।

- **आर्थिक जोखिम र ब्याजको भार :**

नगर विकास कोष बाट लिएको ६ वर्षे ऋणको ३ वर्षको सहूलियत अवधि करिब सकिन लागेको अवस्थामा छ । निर्माणमा र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा ब्याजको भार बढ्ने भएकोले आयोजनाको वित्तीय पक्षमा दबाव पर्ने डर रहेको छ ।

- **योजना र पूर्वाधार विकासको सिमितता :**

व्यास नगरपालिकाको पाइलट आयोजनाका रूपमा सुरु गरिएको यस बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजनाको स्थानीय जग्गाधनीहरूलाई योगदानको भार घटाउनका लागि योजना र पूर्वाधार विकासमा खुम्चिनुपरेको अवस्था रहको जसले गर्दा अझ बृहत रूपमा आयोजनाका पूर्वाधार विकास गर्न सम्भव नभएको ।

- **सरकारी आश्वासनप्रति अविश्वास :**

विगतको असफल आयोजनाका कारण स्थानीयमा सरकारप्रति पूर्ण विश्वास नदेखिएको । पहिलो चरणको कार्य स्पष्ट रूपमा नदेखिँदासम्म दोस्रो चरणमा सहभागिता बढाउन चुनौती रहेको ।

जग्गा एकीकरणको संस्थागत विकास र आगामी योजनाहरू

व्यास नगरपालिकाले जग्गा एकीकरण प्रक्रियालाई केवल एउटा आयोजना मात्र नभई व्यवस्थित शहरी विकासको दिगो र संस्थागत आधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बैरेनी क्षेत्रको प्रथम चरणको पाइलट आयोजनाबाट प्राप्त अनुभवले नगरपालिकाले स्वयं प्राविधिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व लिन सक्ने क्षमताको प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ र नगर समुदायमा पनि यस प्रकारका आयोजना र समग्र स्थानीय सरकार प्रतिको विश्वास सुदृढ गरेको छ । यही अनुभव, आत्मविश्वास र नगर समुदायको विश्वासलाई आधार बनाई आगामी दिनमा थप ठूला तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।

१) बृहत बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना (दोस्रो चरण)

बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजनाको पहिलो चरणबाट प्राप्त अनुभव र स्थानीयको सकारात्मक सहभागितालाई आधार मानी वडा नं. १० मा बृहत क्षेत्र समेट्ने गरी दोस्रो चरणको आयोजना अघि बढाइएको छ। करिब १५३६ रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तार हुने यस आयोजनाले ठूलो संख्यामा रहेका विखण्डित जग्गा कित्ताहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा पुनर्संरचना गरी आधुनिक पूर्वाधारयुक्त बस्तीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस आयोजनालाई थप वैज्ञानिक, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (म्पेच) तयार गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ । यसले आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक तथा कार्यान्वयन पक्षलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।

२) मानहुँकोट पर्यटकीय ग्राम - जग्गा एकीकरण आयोजना

व्यास नगरपालिका वडा नं. ५ मा अवस्थित मानहुँकोट यस क्षेत्रको प्राकृतिक दृष्टिले एक महत्वपूर्ण आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो । दमौली बजार नजिकै रहेको यो क्षेत्र आफ्नो मौलिक पहिचान र दृश्यात्मक सौन्दर्यका कारण दीर्घकालीन पर्यटन विकासका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त मानिन्छ।

यस सम्भावनालाई व्यवस्थित र दिगो रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले करिब ७०० रोपनी क्षेत्रफलमा पर्यटकीय ग्रामको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनबाट यो क्षेत्र आयोजना कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त देखिएको छ। यस आयोजनालाई नगरपालिकाको आफ्नै जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत तयारी भइरहेको छ। यसले मानहुँकोटलाई योजनाबद्ध पूर्वाधारसहितको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संस्थागत सबलीकरण र भावी दिशा

व्यास नगरपालिकाले जग्गा एकीकरण कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा अधि बढाउन समर्पित र सक्षम जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन इकाईको विकास तथा सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ। यस इकाईमार्फत स्थानीय स्तरमै प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोजना कार्यान्वयनलाई आत्मनिर्भर, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

यी आयोजनाहरू केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम मात्र नभई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो शहरी जीवन निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचका अभिव्यक्ति हुन्। नगरपालिकाको दृढ प्रतिबद्धता र स्थानीय बासिन्दाको सक्रिय सहभागिताले व्यास नगरपालिकालाई योजनाबद्ध शहरी विकासको एक प्रभावकारी नमूनाका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ।

अन्य स्थानीय निकायका लागि अनुकरणयोग्य नमुना (Replication Model)

बैरेनीको अनुभवले देखाएको छ कि जग्गा एकीकरण केवल इन्जिनियरिङ मात्र नभई एक जटिल सामाजिक र कानुनी प्रक्रिया पनि हो। अन्य पालिकाले यो नमूनाका रूपमा अपनाउँदा निम्न ५ वटा खम्बालाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ:

१) स्वायत्त र समावेशी संस्थागत संरचना

❖ स्वतन्त्र उपभोक्ता समिति:

आयोजनाको नेतृत्व जनप्रतिनिधिले भन्दा स्थानीय बासिन्दाले नै गर्नुपर्छ। वडा अध्यक्षलाई “सहजकर्ता” को रूपमा राख्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह कम हुन्छ र पारदर्शिता बढ्छ।

❖ स्थानीय जनशक्ति परिचालन:

“जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU)” मा स्थानीय परिवेश बुझ्नेका प्राविधिकहरूलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्थिर रूपमा खटाउनुपर्छ, जसले जनतासँग बलियो विश्वासको सम्बन्ध बनाउँछ।

२. सामाजिक सम्भाव्यता र विश्वासको वातावरण

❖ देखिने विकास (Visual Learning):

जग्गाधनीहरूलाई सफल आयोजनाहरूको स्थलगत भ्रमण (जस्तै भक्तपुर) गराउनु सबैभन्दा प्रभावकारी सिकाई हो। यसले “कागजी योजना” लाई “प्रत्यक्ष अनुभव” मा बदल्छ र भ्रमहरू चिर्दछ।

❖ सर्वपक्षीय सहमति:

आयोजनालाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठाउन सबै राजनीतिक दल र आदिवासी (दराई, बोटे) तथा महिलाहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

३. पूर्व-तयारी: कानुनी र प्राविधिक गाँठो फुकाउने रणनीति

❖ तथ्याङ्कको प्रारम्भिक प्रमाणीकरण:

आयोजनाको योजना निर्माण गर्नुअघि नै मालपोत र नापीको रेकर्ड र फिल्डको जग्गा जुधाएर सच्याउनुपर्छ। कर्मचारी सरुवा र समन्वयको भन्फटलाई आयोजनाको सुरुमै कार्यविधि बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ।

❖ गुठी जग्गाको शीघ्र समाधान:

आयोजना क्षेत्रमा गुठी जग्गा भएमा त्यसको कानुनी जटिलता (क्षतिपूर्ति र फिर्ता प्रक्रिया) लाई DPR तयारीकै चरणमा मालपोत र गुठी संस्थानसँग समन्वय गरी टुंगो लगाउनुपर्छ।

४. निर्माण व्यवस्थापन र ठेकेदार उत्तरदायित्व

❖ स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकता:

सानो क्षेत्रमा आयोजना कार्यान्वयन वा सामान्य पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने अवस्थामा सम्भव भए ठूला र बाहिरका ठेकेदारहरूको ढिलासुस्ती रोक्न स्थानीय स्तरकै ठेकेदार वा कामदार प्रयोग गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ। स्थानीय ठेकेदारहरू समुदायप्रति बढी जवाफदेही हुन्छन्।

❖ समय सीमा र ब्याज व्यवस्थापन:

निर्माण अवधि लम्बिन नदिन कडा अनुगमन प्रणाली बनाउनुपर्छ, ताकि ऋणको ब्याज भारले आयोजनालाई आर्थिक रूपमा धराशायी नबनाओस्।

५. सामाजिक संवेदनशीलता र लचिलो नीति

❖ यस प्रकारको आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकायको कठोर नीति उपयोगी हुदैन। उदाहरणका लागि आयोजना अवधिभर जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीय जग्गाधनीको समस्या लाई मध्यनजर गर्दै विशेष अवस्थामा जग्गा बिक्री वा हक हस्तान्तरण, धितो प्रयोजन, आदिको लागि लचिलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्भव भएमा नगरपालिकाले यस्तो बेला जग्गा किनिदिन “रिभाल्विङ फण्ड” जस्तो नीति स्थापना गर्नु अझ उत्तम हुन्छ। यस प्रकारको सामाजिक संवेदनशीलता र लचिलो नीतिले समुदायको विश्वास जित्न मद्दत गर्दछ।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण

बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना हाल नेपालका विभिन्न स्थानीय तहहरूका लागि अध्ययनको विषय बनेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालिन महानिर्देशक तथा उप-महानिर्देशक समेत को टोलि लगायात नेपालमा शहरी विकासका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था तथा व्यक्तित्वहरु पनि यस आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गर्नु भएको थियो जसले गर्दा यस आयोजना नेपाल भरी नै परिचित भएको छ।

हाल सम्म निम्नलिखित स्थानीय तह बाट विभिन्न मितिमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सम्भावित आयोजना क्षेत्रका उपभोक्ता जग्गाधनी समेत को टोलि यस आयोजनाको अध्ययन अवलोकन हेतु आउने क्रम जारी छ :

- भानु नगरपालिका, तनहुँ
- शुक्लागण्डकी नगरपालिका, तनहुँ
- सुन्दरबजार नगरपालिका, लम्जुङ
- नार्पा भूमि गाउँपालिका, मनाङ
- कावासोती नगरपालिका, नवलपुर
- रोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक

- खुम्बु पासाङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु
- विरेन्द्रनगर नगरपालिका, दाङ

यस्तै काठमाडौँबाट शहरी विकास सम्बन्धि विषयका विद्यार्थीहरूको पनि जग्गा एकीकरण आयोजनाको अध्ययन अवलोकनका लागि व्यास नगरपालिका आउने गरेका छन् ।

यसरि नै बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना राष्ट्रिय सिमाना नाघेर अमेरिकाको विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (MIT) सम्म पुगेको छ । नेपाल इन्स्टिच्युट अफ अर्बन एण्ड रिजनल स्टडिज (NIURS) सँगको सहकार्यमा MIT का शहरी योजना का स्नातकोत्तर विद्यार्थी मिलन चुटानी (Mr.Milan Chuttani) ले यहाँको स्थलगत अध्ययन गरी विशेष शोध तयार पार्नुभएको छ । MISTI दक्षिण एशिया कार्यक्रमको सहयोगमा गरिएको यस अध्ययनले कसरी स्थानीय जनसमुदायको विश्वास जितेर विकासोन्मुख देशहरूमा जीवन्त शहर निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक जगतमा पुर्याएको छ ।

निष्कर्ष

बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना केवल एउटा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम होइन, यो व्यास नगरपालिकाले अपनाएको एक सोच, एक दृष्टिकोण र अव्यवस्थित शहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै योजनाबद्ध, समावेशी र दिगो शहर निर्माण गर्ने दिशामा एक व्यवहारिक प्रयोग हो ।

यस आयोजनाले स्पष्ट देखाएको छ कि शहरी विकास केवल सडक, ढल र प्लटिङको विषय होइन, यो विश्वास निर्माण, सहमति जुटाउने क्षमता, र कानुनी-प्राविधिक जटिलतासँग जुध्ने धैर्यको संयुक्त परिणाम हो । विगतका असफल प्रयासरूबाट सिकेर, स्थानीय सरकारको सक्रिय नेतृत्व, समुदायको सहभागिता, र प्राविधिक टिमको निरन्तर संलग्नताले बैरेनीलाई एक जीवित उदाहरणमा रूपान्तरण गरेको छ ।

यद्यपि, ढिलासुस्ती, संस्थागत समन्वयको कमजोरी, र आर्थिक दबाव जस्ता चुनौतीहरूले एउटा महत्वपूर्ण पाठ पनि दिएका छन् :

“सही मोडेल मात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयनमा कडाई, प्रतिवद्धता र उत्तरदायित्व भनै आवश्यक हुन्छ”

अन्ततः, बैरेनीले देखाएको बाटो स्पष्ट छ :

“यदि स्थानीय तहले स्वामित्व लिन्छ, समुदायलाई केन्द्रमा राख्छ, र प्रारम्भ देखि नै जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्छ भने सीमित स्रोतका बाबजुद पनि व्यवस्थित शहरी विकास सम्भव छ”

अतः बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना एउटा “आयोजना” मात्रै होइन, यो त भविष्यमा नेपालका शहरहरू कसरी बन्न सक्छन् भन्ने प्रश्नको एक व्यवहारिक उत्तर पनि हो ।
